Avance de obra

Semana 3 · 16 al 22 de noviembre de 2026



3 de 13	15 feb 2027	31 ene 2027	86 días
semanas	fecha pactada	entrega estimada	restantes


¿Cómo vamos?

Cumplimiento de fecha: dentro de fecha
Vamos en tiempo, con un real de 25% frente al 24% planeado.

Atención
La cubierta de cocina necesita tu decisión esta semana.


GRÁFICA 1

Avance real contra avance proyectado

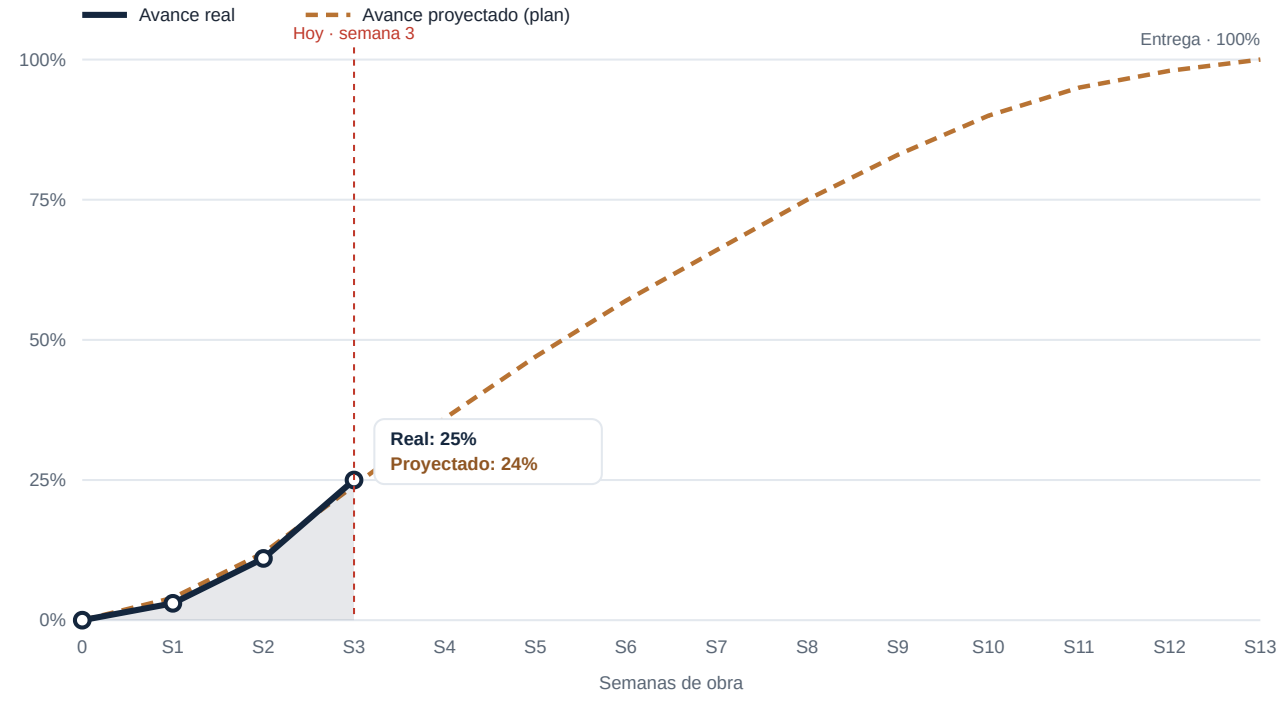

GRÁFICA 2

Fuerza de trabajo por día

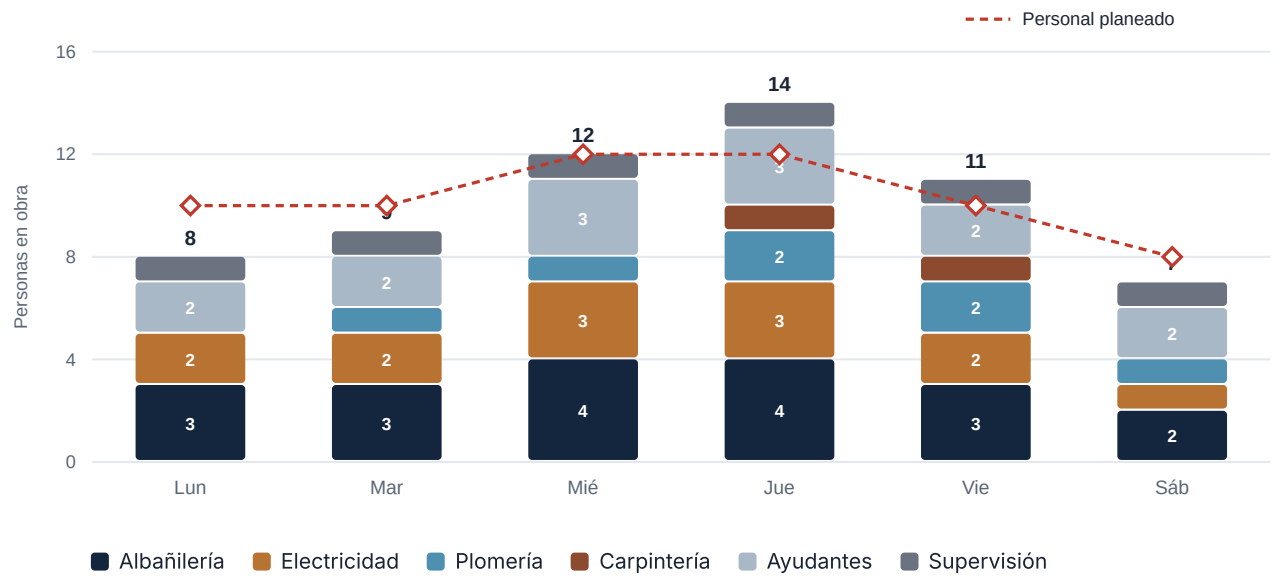

14

Pico de personal
El jueves fue el día con más gente en obra.

10.2

Promedio por día
Personas trabajando en obra, según los días registrados.

DETALLE

¿Quién trabajó cada día, y en qué?

ESPECIALIDAD / PARTIDA	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	JORNALES
Albañilería Muros, nivelación y demolición	3	3	4	4	3	2	**19**
Electricidad Canalización y cableado	2	2	3	3	2	1	**13**
Plomería Puntos de agua y tubería	·	1	1	2	2	1	**7**
Carpintería Medidas de cocina y puertas	·	·	·	1	1	·	**2**
Ayudantes Acarreo, limpieza y apoyo	2	2	3	3	2	2	**14**
Supervisión Coordinación y calidad	1	1	1	1	1	1	**6**
Total del día	**8**	**9**	**12**	**14**	**11**	**7**	**61**

Detalle de la obra

Fases de la obra

Hoy

Diagnóstico	Demolición	Instalaciones	Albañilería y pisos	Acabados	Entrega

Avance por área

Instalación eléctrica 70%
Cableado casi completo. Falta el tablero.

Cocina 45%
Muro retirado, ductos listos. Sigue el piso.

Plomería 40%
Tubería nueva en cocina; falta el baño.

Baño 30%
Demolición lista. Sigue impermeabilizar.


Sala 10%
Preparación eléctrica.

Recámara 5%
Marcado de salidas.

Pisos 0%
Espera a instalaciones.

Acabados 0%
Última etapa.

Así se ve la obra



Cocina · imagen de ejemplo



Recámara · imagen de ejemplo

Próxima semana

- Nivelar el piso de la cocina.
- Instalar el tablero eléctrico.
- Impermeabilizar el baño.
- Iniciar plomería del baño.
